

RB-King säiliöiden asennusohje

Yleistä

Moduulielementtien asentamisessa on aina noudatettava Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra RYL 2010 "Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset" ja Infra RYL 2006 Osa 2 "31000 Vesihuolto" esitettyjä ohjeita, jotka koskevat kaivo- pumppaamo ja säiliöjärjestelmiä. Lisätietoa myös Betoniteollisuus Ry:n 2017 julkaisemasta "Betoniset viemärit- ja hulevesijärjestelmät" käsikirjasta. Aineisto on ladattavissa ositteesta http://betoni.com/wp-content/uploads/2015/04/Betoniset_viemari_ja_hulevesijarjestelmat.pdf

Yleisesti elementtien asentamisesta löytyy ohjeistusta:

<http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/elementtien-asennus/asennusohjeet?term=asennus>

Tämä asennusohje ei korvaa edellä mainittuja ohjeita eikä ko. kohteen suunnitelma-asiakirjoja. Urakoitsijan tulee laatia asennustöistä asennussuunnitelma.

Tilaaaja vastaa maaperän rakentamiskelpoisuudesta, kantavuudesta ja olosuhteista. Tilaaajan tulee aina varmistaa ennen moduulien asentamista rakennuspohjan kantavuus levykuormitus- tai pudotuspainokokein työmaalla. Kantavuuskokeet tulee dokumentoida. Epäselvissä tilanteissa tilaaajan tulee tarvittaessa teettää pohjarakennesuunnitelmat.

Moduulirakenteiset säiliöt ja -kaivot voidaan sijoittaa liikennealueelle tai liikennealueen ulkopuolelle. Ne voidaan sijoittaa pohjavesitason ylä- tai alapuolelle, huomioiden että tiiviste kestää 0,5 bar ulkoisen vedenpaineen. Säiliöön kohdistuvat rasitukset tarkastetaan aina tapauskohtaisesti.

Noudata aina kohteen suunnittelijan tekemiä suunnitelmia. Mikäli kohteessa joudutaan poikkeamaan suunnitelmista, poikkeamiseen on saatava kirjallisen lupa suunnittelijalta.

Säiliöiden ja kaivojen kokoonpanoon, teknisiin ratkaisuihin ja komponentteihin ei saa tehdä muutoksia tai niihin verrattavia asennuksia ilman Ruskon Betoni Etelä Oy:n suunnittelijan lupaa.

Vastaanottotarkastus

Tuotetta vastaanotettaessa tarkista, että tuotteen laatu ja määrä on tilausvahvistuksen mukainen.

Tarkista ettei tuotteeseen ole tullut kuljetusvaurioita tms. niihin verrattavia virheitä, jotka voisivat vaikuttaa tuotteen toimivuuteen.

Mikäli huomaat kuljetusvaurion tai vastaavan, tee siitä merkintä rahtikirjaan ja ole myös välittömästi yhteydessä Ruskon Betoni Etelä Oy:lle.

Asennuksessa huomioitavia seikkoja sekä täytöt

Kaivanto on pidettävä kuivana asennustyön aikana.

Tuotteet asennetaan vaakasuoralle tasaiselle routimattomalle alustalle. Kiviainekset tulee olla routimattomia, eikä jäätynyttä maa-ainesta tule käyttää. Asennusalustan pohja tasoitetaan ja tiivistetään maksimissaan 63mm rakeisella murskeella. Asennusalustan paksuus tulee olla vähintään 150mm ja tiivistysasteen > 90 %. Moduuleiden sivuilla (min. 0,4m) etäisyydellä ulkopinnasta lopputäyttö tehdään routimattomalla materiaalilla. Kaivannon pohja tulee olla mahdollisimman tasainen. Kaivannon pohjan tasaisuudella varmistetaan asennuksen onnistuminen

Nostettaessa kappaleita kaivantoon, tulee tehdä koenosto nostamalla elementti kuljetusajoneuvosta irti n. 100mm, varmistaen, että säiliö pysyy tasapainossa noston aikana. Nostoissa käytetään aina niihin suunniteltuja nostolukkoja. Varmista ennen nostoa, että nostolukko on oikein päin ja kunnolla asettunut paikalleen.

Nostolukot toimitetaan moduulitoimituksen mukana ja ne palautetaan tehtaalle nostotyön jälkeen. Elementin nostopisteet ovat elementtisuunnitelmien mukaan elementin yläpinnassa. Elementti nostetaan aina nelipistenostona. Nostokulma elementillä max 15° (nostoraksin haarakulma max 30°). Autonosturin dynaaminen kerroin max 1,6.

Varmista aina turvallinen nosto.




Elementtejä ei saa raahata, pyörittää tai pudottaa.

Saumoissa oleva tiiviste, sekä naaraspuun huuloksen sisäpinta puhdistetaan ja käsitellään asennusaineella ennen moduuliosien asentamista paikalleen. Käytä tiivisteissä tiivisteiden valmistajan omaa asennusainetta.




Vaaka-asennuksissa murskealustaan tulee tehdä elementin sauman kohdalle asennusura, jotta kivet eivät nouse asennussaumaan.

Elementit nostetaan n. 100mm päähän toisistaan ja yhdistetään saumat toisiaan vaste. Elementtien yhteen liittämiseksi voidaan käyttää taljoja, pulleria, kaivinkonetta tai näiden yhdistelmiä.

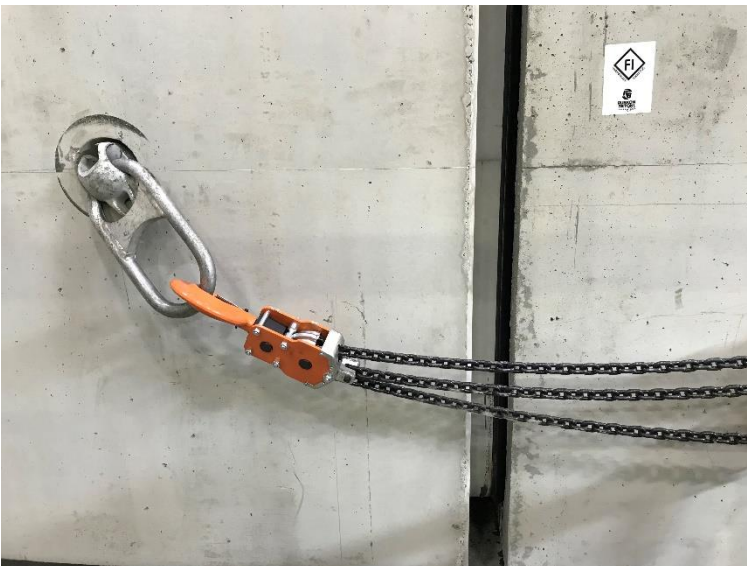



Valmiiden saumojen rako tulee olla sisäpuolella 0 – 35mm vesitiiveyden saavuttamiseksi.

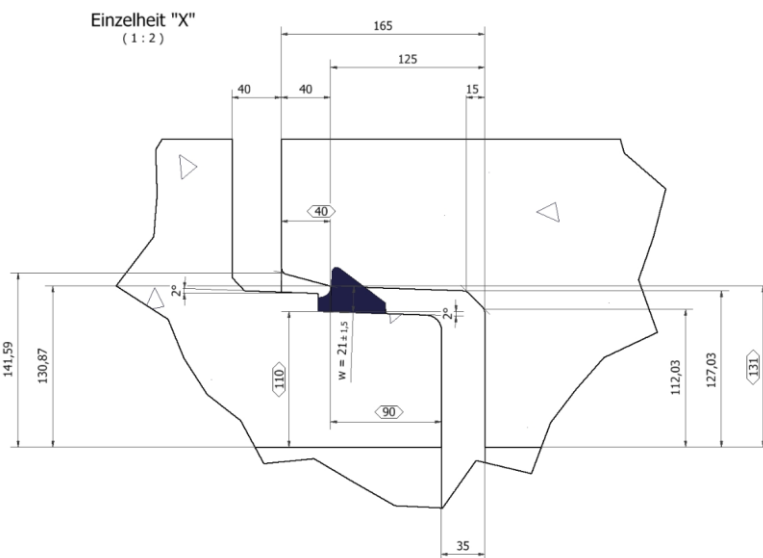

Pidä tuotteiden luukut, liitântäputket ym. yhteen suljettuna ja suojattuna niin, ettei putkiin, kaivon tai säiliöön pääse vettä, epäpuhtauksia tms.

Varmista, että säiliö/elementti on varmasti suorassa ja oikeassa asennuskorossa.

Työturvallisuus

Kaivon/säiliön omistajan ja tilaajan tulee huomioida laitoksensa/yrityksensä työturvallisuusohjeet laatiessaan kaivo- ja säiliötyöskentelyn työohjeet kohteessa. Ko. työohjeissa tulee huomioida mahdolliset kohdekohtaiset pelastusohjeet. Kaivo- ja säiliötyömaalla työskentelevien käyttää työturvallisuusohjeiden mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Kaivossa ja säiliössä työskennellessä on mukana oltava avustava henkilön kaivon/säiliön ulkopuolella. Tarvittaessa säiliössä/kaivossa työskentelevällä on oltava nostonaruilla varustettu turvaliivi. Kaivoa/säiliötä on tuuletettava riittävästi, min 10 minuuttia, ennen kaivon laskeutumista. Mahdollisia



hitsaustöitä ei saa aloittaa ennen kuin kaivo/säiliö on todettu kaasuttomaksi. Kaivoon/säiliöön asennettuja toimilaitteita käytettäessä on huomioitava ko. toimilaitteenomat käyttöohjeet. Kaivot/ säiliöiden kannet on lukittava, jotta estetään asiattomien pääsy ko. tiloihin. Sähköasennuksissa on aina noudatettava Suomen sähköalan määräyksiä ja turvallisuusohjeita. Käytä sähköasennuksiin vain sähkötöihin luvan saanutta henkilöä.

Ruskon Betoni Etelä Oy
